



ข่าวสำนักก่อสร้างทาง

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ



ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2568 โครงการก่อสร้างถนนสาย จช.2004 แยก ทล.34 - ทล.314 อ.บางปะกง, เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ตอนที่ 2)

ประชุม Site Meeting



วันศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 โครงการฯ ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน (Site Meeting) 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าจ้างฯ, ผู้ควบคุมงานฯ, และผู้รับจ้างฯ มีการรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับงานก่อสร้างของโครงการฯ แนวทางการแก้ไขปัญหาและวางแผนการดำเนินงานต่อไป


ความคืบหน้างานก่อสร้าง



งานควบคุมและตรวจสอบงานเสาเข็มตอก หล่อสำเร็จ ขนาด 0.30x0.30x9.00 เมตร (สำหรับกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่น) กม.ที่ 0+912 - 1+050 LT และ กม.ที่ 1+240 - 1+314 RT



งานควบคุมและตรวจสอบงานผลิตเสาเข็มตอก หล่อสำเร็จ ขนาด 0.30x0.30x9.00 เมตร (สำหรับกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่น) โรงหล่อเสาเข็ม บริษัท อินเตอร์เสาเข็ม จำกัด

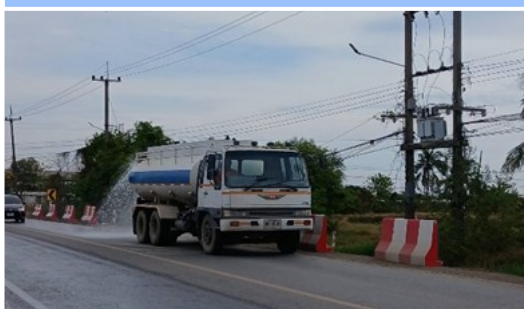

งานควบคุมและตรวจสอบงานรตน้ำป้องกันฝุ่นเพื่อลดมลภาวะในการก่อสร้าง กม.ที่ 0+000 - 6+500 LT,RT และงานวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในการก่อสร้าง

หากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสสัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้าง และพบเห็นงานก่อสร้างดังกล่าว ขอให้ร่วมกันขับขี่ยานพาหนะอย่างระมัดระวัง และโครงการฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-5515598 โทรสาร. 02-5515615

www.cs20004road-2.com
